PROCES VERBAL DE VERIFICATION AVANT MISE (OU REMISE) EN SERVICE ESCALIB MILLS MDS

☐ ***Assemblage et 1ère mise en service*** ☐ ***Déplacement*** ☐ ***Ajout ou suppression d'éléments***

Seul l'installateur est autorisé à modifier l'Escalib Mills MDS à la demande du donneur d'ordre.

Entreprise – Donneur d'ordre – Utilisateur : .....
Nom du chantier : .....
Localisation sur le chantier : .....
Nom du vérificateur : .....

DESCRIPTIF DE L'ESCALIB MILLS MDS
Nombre de modules (maxi 8) : .....
Hauteur desservie : .....

CONTROLE DE L'ESCALIB MILLS MDS

		Conformité Oui	Conformité Non
1	**Montage suivant :** ·· **La notice technique** ou ·· **Le plan n°**..... **du**	☐	☐
2	**Assise au sol / Réglage des pieds**	☐	☐
3	**Horizontalité / verticalité de l'Escalib**	☐	☐
4	**Orientation de l'Escalib suivant la dalle à desservir. Sortie entièrement sécurisée**	☐	☐
5	**Accessibilité au pied de l'Escalib par au moins 1 des 2 faces d'entrée (face principale A ou secondaire B)**	☐	☐
6	**Assemblage des modules et de l'embase : Présence des 4 vis M24, correctement serrées**	☐	☐
7	**Présence indispensable et bon positionnement du garde-corps de fermeture et de son boulon**	☐	☐
8	**Sur le module de tête, lisse de montage en position verticale si la dalle à desservir se situe face B ou en position horizontale pour les autres faces**	☐	☐
9	**Hormis la face desservant la dalle, verrouillage correct de toutes les lisses garde-corps**	☐	☐
10	**Amarrage de l'Escalib conforme à la notice technique et/ou au plan**	☐	☐
11	**Aucun obstacle gênant dans la zone de circulation à l'intérieur de l'Escalib**	☐	☐

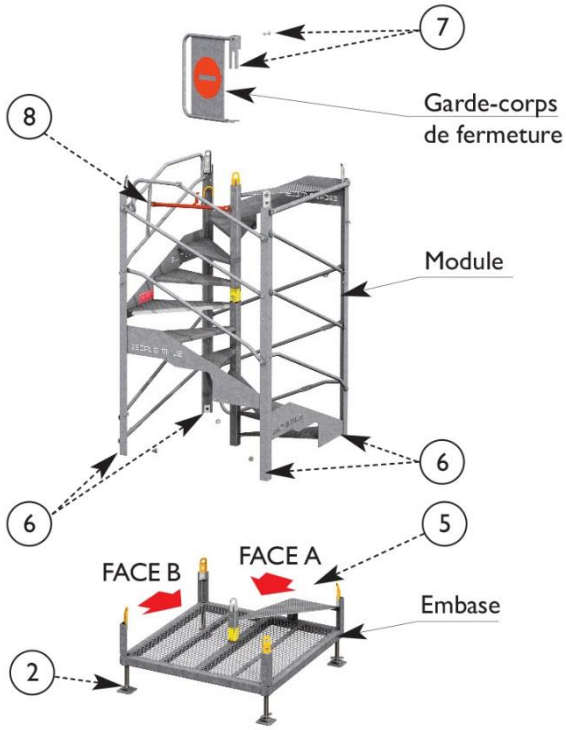

Mills
Echafaudage - Etaiement - Coffrage
82, RUE EDOUARD VAILLANT
93351 LE BOURGET CEDEX
T. : 01 48 35 65 65 - F. : 01 48 37 20

Respecter la notice technique Escalib Mills disponible sur **www.mills.fr**

COMMENTAIRES

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pour toute case « NON » cochée, des modifications ou des remplacements devront être effectués avant utilisation de l'Escalib Mills MDS. Une nouvelle vérification sera programmée suite aux corrections d'un ou des éléments non-conformes.

AUTORISATION D'UTILISATION

OUI ☐ **NON** ☐ **Date*** _____

Visa du VERIFICATEUR

**** A compter de ce jour, le donneur d'ordre assurera le gardiennage et le bon état de conservation de l'Escalib Mills MDS jusqu'au démontage.***
